КЕЙС 01 · СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА · PMI · WATERFALL

«Алабуга»: проект по стандарту PMI

Кейс от первого лица: как я выстроил управление проектами в холдинге

Холдинг на 27 000 сотрудников · портфель проектов 800+ млрд ₽ · проектный офис ~100 человек · 23 недели

davkazimpmo@gmail.com · Telegram @kazim40000 · WhatsApp +7 967 699-94-84

ДО ПРОЕКТА · СИТУАЦИЯ

С чего я начал: что было до меня

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ

- **Единой системы управления проектами не было**
- **Зоны ответственности размыты, решения точечные**
- **Связь между подразделениями нарушена**
- **Данные не передавались между отделами**
- **Мониторинга, контроля и отчётности не было**
- **Разный уровень подготовки специалистов**
- **Переработки 12–16 часов в день, поток «горящих» задач**

ЦЕНА БЕЗ СИСТЕМЫ

НЕ ВИДНО КАРТИНЫ

Нет единого статуса проектов и портфеля

РЕШЕНИЯ ТОЧЕЧНО

Реакция вместо управления и приоритизации

ЛЮДИ ПЕРЕГРУЖЕНЫ

12–16 часов, выгорание, текучесть

ПОТЕРИ РЕСУРСОВ

Дублирование, срывы сроков и бюджетов

Я начал с диагностики: сначала увидеть систему целиком, потом строить. Без этого методология остаётся теорией.

РАМКИ ПРОЕКТА

Как я зафиксировал рамки проекта

Я выстраивал единую систему управления проектами в холдинге с масштабной инвестиционной программой. Работал по методологии PMBOK, метод — водопад (predictive).

27 000
сотрудников холдинга

800+ млрд ₽
портфель проектов

~100
человек в проектном офисе

23 нед
срок проекта

PMI
PMBOK · waterfall

РАМКИ ПРОЕКТА

- Спонсор — генеральный директор; РП — руководитель ПМО
- Цель: единая система управления проектами и данными
- Измеримый результат: +40–45% скорость, −15–20% расходы
- Объём: 100+ проектов в портфеле, 5 функциональных блоков ПМО

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИЁМКА

- NDA и уровни доступа к информации
- Запрет увольнений: только переводы внутри компании
- Приёмка: портфель под контролем, отчётность работает
- Закрытие: система работает без постоянного участия РП

ОБЗОР ПРОЕКТА

Как была устроена работа: пять этапов

1. Инициация нед. 1–2	2. Планирование нед. 3–5	3. Выполнение нед. 6–21	4. Мониторинг и контроль нед. 1–23	5. Закрытие нед. 22–23
процессы: 4.1 · 4.2	**процессы: 5.1 — 5.20**	**процессы: 6.1 — 6.10**	**процессы: 7.1 — 7.12**	**процессы: 8.1**
▪ Устав проекта ▪ Карта стейкхолдеров	▪ План управления ▪ WBS, график, бюджет ▪ Реестр рисков	▪ Оргструктура ▪ Методология ▪ Данные и обучение	▪ Статус-отчёты ▪ План-факт ▪ Ведомость изменений	▪ Финальный отчёт ▪ Передача и архив

КАЛЕНДАРНАЯ ЛЕНТА · 23 НЕДЕЛИ

Мониторинг и контроль — непрерывно на всём протяжении проекта (нед. 1–23)

2 нед.	3 нед.	16 нед.	2 нед.
Инициация	Планирование	Выполнение	Закрытие

ЭТАП 1 · ИНИЦИАЦИЯ

С чего я начал: устав и карта стейкхолдеров

УСТАВ ПРОЕКТА · 4.1

- Название и код проекта
- Цель и измеримые показатели успеха
- Спонсор проекта и руководитель проекта
- Рамки: объём, сроки, ориентир бюджета
- Ограничения, допущения, начальные риски
- Полномочия руководителя проекта
- Критерии приёмки и условия закрытия

МАТРИЦА ВЛИЯНИЕ × ИНТЕРЕС · 4.2

НАБЛЮДАТЬ

Подрядчики, смежные подразделения, внешние консультанты

ИНФОРМИРОВАТЬ

Команды проектов, специалисты, аналитики

УПРАВЛЯТЬ ВОВЛЕЧЕНИЕМ

Генеральный директор, руководители производств, спонсор

УДОВЛЕТВОРЯТЬ

Юридический блок, служба безопасности, финансы

Я разложил стейкхолдеров по влиянию и интересу, а стратегию работы с каждым закрепил в плане коммуникаций.

Как я разложил работу на пакеты (WBS)

Проектный офис для холдинга — 100%

1.1 · 25% Организация и регламенты	1.2 · 20% Методология и шаблоны	1.3 · 20% Информационная система	1.4 · 15% Компетенции и обучение	1.5 · 20% Портфель и контроль
▪ Оргструктура ПМО ▪ Роли и полномочия ▪ Регламенты и протоколы ▪ Матрица ответственности	▪ Жизненный цикл проекта ▪ Контрольные точки ▪ Шаблоны документов ▪ Стандарт отчётности	▪ Базы задач ▪ НСИ и справочники ▪ Панель мониторинга ▪ Разграничение доступа	▪ Обучение руководителей ▪ Грейды ▪ Наставничество ▪ Обратная связь	▪ Инвентаризация 100+ проектов ▪ Приоритизация ▪ KPI и отчётность ▪ Контроль сроков и бюджетов

Я разбил работу на пять пакетов с суммой весов 100%: у каждого — владелец, срок и критерий готовности.

Календарный план, который я вёл по критическому пути



Я определил критический путь (методология → портфель) и приоритизировал ресурсы под него: отставание здесь тянуло бы весь график.

ВЕХИ



ЭТАП 2 · ПЛАНИРОВАНИЕ · 5.9 — 5.11

Как я утвердил бюджет по вехам

БЮДЖЕТ ПО ВЕХАМ · 5.10

ВЕХА	ДОЛЯ	КРИТЕРИЙ ЗАКРЫТИЯ
B1 Инициация	8%	Устав утверждён, стейкхолдеры определены
B2 Планирование	22%	План, WBS и бюджет утверждены
B3 Методология	25%	Регламенты и шаблоны внедрены
B4 Внедрение	30%	Команда обучена, базы задач запущены
B5 Контроль	15%	Портфель под контролем, отчёт передан

Бюджет я утверждал по вехам: к следующей вехе переходили только после закрытия предыдущей.


ПЛАН КАЧЕСТВА · 5.11

- Критерии приёмки по каждой вехе
- Ревизия регламентов перед внедрением
- Проверка полноты и достоверности данных
- Проверка отчётности на пригодность для ЛПР
- Утверждение спонсором на каждой вехе

Абсолютные суммы не раскрываются (NDA).

ЭТАП 2 · ПЛАНИРОВАНИЕ · 5.15 — 5.18

Какие риски я заложил заранее

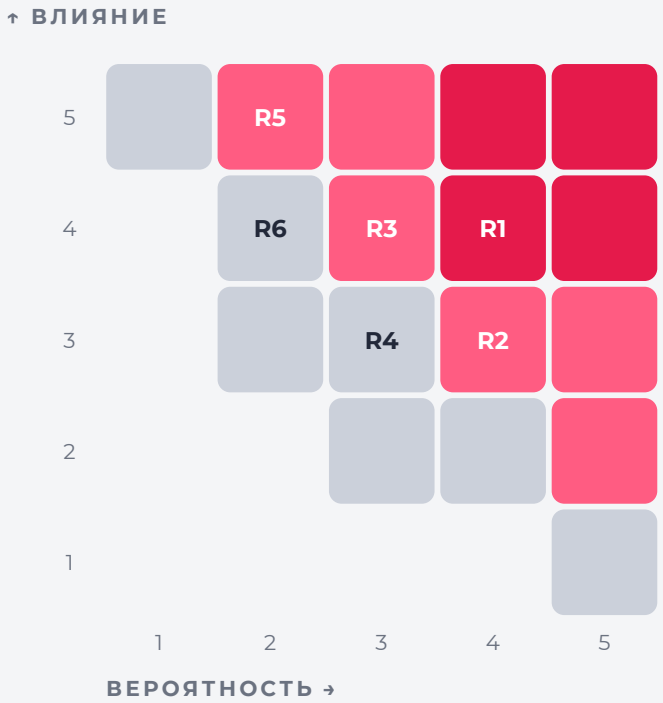

R1 **Сопротивление руководителей подразделений**
Управление стейкхолдерами, вовлечение ЛПР, ранние быстрые победы

R2 **Разные стандарты и практики у подразделений**
Унификация регламентов, шаблоны, обязательное обучение

R3 **Неполнота и низкое качество входных данных**
Валидация источников, единая НСИ, контроль полноты

R4 **Перегрузка команды в переходный период**
Планирование ресурсов, приоритизация, эскалация по правилам

R5 **Кадровые потери при реорганизации**
Переводы вместо увольнений, грейды, дорожные карты

R6 **Утечка и уровни доступа к информации**
Разграничение доступа, согласование с СБ на каждом этапе

Реестр рисков я пересматривал на каждой контрольной точке: новые добавлял, закрытые выводил со статусом.

ЭТАП 2 · ПЛАНИРОВАНИЕ · 5.13 · 5.12

Как я выстроил коммуникации и ответственность

ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ · 5.13

КОМУ	ЧТО	ЧАСТОТА
Спонсор	Статус, отклонения, решения	По вехам
Руководители	Статус портфеля, ресурсы	Еженедельно
Команда ПМО	Задачи, приоритеты, эскалации	Ежедневно
Проектный комитет	Бюджет, крупные изменения	Ежеквартально

Я задал ритм: утренний стендап в команде, еженедельная сводка руководителям, ежемесячный отчёт спонсору, квартальная защита в проектном комитете.

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ · 5.12

ДЕЙСТВИЕ	РП	ПМО	ЛПР	СПН	ИТ
Утверждение устава	**R**	**C**	**I**	**A**	**I**
Утверждение плана	**R**	**C**	**C**	**A**	**I**
Внедрение регламентов	**A**	**R**	**R**	**I**	**C**
Ведомость изменений	**A**	**R**	**C**	**I**	**C**
Контроль портфеля	**A**	**R**	**C**	**I**	**R**
Закрытие проекта	**A**	**R**	**I**	**I**	**C**

R — исполнитель · A — ответственный · C — консультация · I — информирование. РП — руководитель проекта, СПН — спонсор.

Какую структуру проектного офиса я построил

Руководитель проектного офиса
около 100 человек · в прямом подчинении 30–45

Управление портфелем 20 человек	Методология 15 человек	Аналитика и данные 20 человек	Операционное управление 30 человек	Компетенции 15 человек
▪ Инвентаризация проектов ▪ Приоритизация ▪ Распределение ресурсов ▪ Отчётность по портфелю	▪ Регламенты и шаблоны ▪ Аудит проектов ▪ Стандарт отчётности ▪ Обновление методологии	▪ Базы задач ▪ НСИ и справочники ▪ Панель мониторинга ▪ Контроль качества данных	▪ Координация отделов ▪ Контроль сроков ▪ Связь между подразделениями ▪ Работа с ЛПР	▪ Обучение руководителей ▪ Грейды ▪ Наставничество ▪ Оценка компетенций

В офисе было около 100 человек; в моём прямом подчинении — 30–45 специалистов.

Методологию я собрал из четырёх блоков

01
Жизненный цикл проекта

- 5 статусов: от «Инициирован» до «Завершён»
- Переход — только по контрольной точке
- Для каждого статуса — свой комплект документов

02
Регламенты и протоколы

- Кто, что и в какие сроки обязан сделать
- Порядок согласований и допусков
- Разграничение уровней доступа

03
Шаблоны документов

- Устав, план проекта, отчёт о статусе
- Реестр рисков и ведомость изменений
- Акт приёмки и финальный отчёт

04
Стандарт отчётности

- Единые метрики и KPI для всего портфеля
- Правила представления данных ЛПР
- Обязательность и периодичность отчётов

Методологию я писал и внедрял на живых проектах: сначала пилот, затем обязательное применение ко всему портфелю.

ЭТАП 3 · ВЫПОЛНЕНИЕ · 6.3

Как я выстроил поток задач и эскалацию

Поступление	Классификация	Распределение	Исполнение	Эскалация
Задача фиксируется в единой базе: источник, срок, ответственный, приоритет.	Присваивается уровень сложности и приоритет; определяется, на каком уровне решается.	Передаётся на уровень руководства или команды. Исполнитель и срок закреплены.	Статус обновляется в базе, контролируется сроком и зависимостями от других задач.	Наверх уходят только те задачи, которые может решить исключительно руководитель.

Я ввёл правило эскалации, и наверх поднималось только то, что действительно требовало решения уровня ЛПР.

ЭТАП 4 · МОНИТОРИНГ · 7.5 — 7.6

Как я контролировал сроки и стоимость

ПАРАМЕТР	БАЗОВЫЙ ПЛАН	МЕТОД КОНТРОЛЯ	РЕАГИРОВАНИЕ
Сроки	Вехи B1 — B5	План-факт по вехам еженедельно	Корректировка графика через ССВ
Стоимость	Бюджет по вехам	Сверка факта с бюджетом вехи	Резерв управления, затем ССВ
Объём	Утверждённый WBS	Проверка новых требований	Только через ведомость изменений
Ресурсы	План ресурсов 5.12	Загрузка команды ПМО	Переприоритизация и эскалация

КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ

Методология → портфель. Ресурсы приоритизировались под этот контур, чтобы отставание не развернуло весь график.

ПРАВИЛО ИЗМЕНЕНИЙ

Любое новое требование — в ведомость изменений. Без утверждения ССВ базовый план не менялся: это удержало объём от расползания.

ЭТАП 4 · МОНИТОРИНГ · 7.2 — 7.7

Как я управлял изменениями и качеством

ПУТЬ ЗАПРОСА НА ИЗМЕНЕНИЕ · 7.2

1. **Запрос**
   Инициатор описывает изменение и ожидаемый эффект.
2. **Регистрация**
   Запрос вносится в ведомость с номером и статусом.
3. **Анализ влияния**
   Оценка влияния на сроки, бюджет, объём и риски.
4. **Решение CCB**
   Совет по изменениям принимает решение: утвердить, отклонить или отложить.
5. **Внесение в план**
   Утверждённое изменение входит в базовый план; команда уведомляется.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА · 7.7

- Проверка регламентов на применимость в работе
- Ревизия заполненности баз задач и отчётности
- Сверка данных между отделами и НСИ
- Проверка комплекта документов по вехе
- Корректирующие действия с владельцем и сроком
- Возврат на доработку при несоответствии критериям

Качество я проверял на артефактах, а не по ощущениям.

ЭТАП 5 · ЗАКРЫТИЕ · 8.1


Что я передал команде на выходе

АРТЕФАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	КОМУ ПЕРЕДАН
Устав проекта	Основание проекта и полномочия РП	Архив проекта, спонсор
План управления проектом	Единая база выполнения и контроля	Внутренняя команда ПМО
WBS и календарный план	Контроль сроков и пакетов работ	Руководители подразделений
Реестр рисков и ведомость изменений	Управление рисками и изменениями	Внутренняя команда ПМО
Панель мониторинга и НСИ	Ежедневный контроль портфеля	Операционное управление
Финальный отчёт и реестр уроков	Опыт компании для будущих проектов	Спонсор и руководители

Система управления после закрытия проекта работает без моего постоянного участия.

Дашборд, по которому я управлял проектом

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО ФАЗАМ, НЕДЕЛЬ

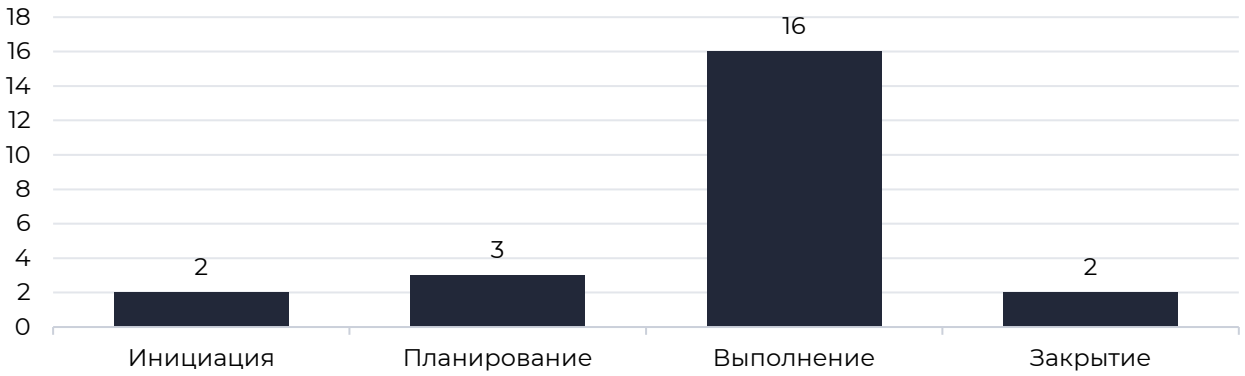

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ЧЕЛОВЕК



СТАТУС ВЕХ

● B1 · Инициация — закрыта	● B2 · Планирование — закрыта	● B3 · Методология — закрыта	● B4 · Внедрение — закрыта	● B5 · Контроль и закрытие — закрыта

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

● Задачи на человека — 60 → 12	● Обработка запросов — 24 → 5 дн	● Предложение — 7 → 3 дн	● Рабочий день — 12 → 9 ч	● Кадровые потери — 0

Сроки — в срок, стоимость — в рамках резерва управления; объём не менялся. Система работает без постоянного участия РП.

ИТОГИ · ДАШБОРД

Результат в цифрах

100
человек в проектном офисе

30–45
в прямом подчинении

+40–45%
скорость выполнения задач

–15–20%
операционные расходы

12 → 9 ч
рабочий день вместо 12–16

БЫЛО → СТАЛО · ключевые процессы



СИСТЕМА ПОСЛЕ ПРОЕКТА

- 100+ проектов под единым контролем
- Единая методология и шаблоны
- Базы задач, НСИ и панель мониторинга
- 0 увольнений: только переводы

ИТОГИ ПРОЕКТА

Что осталось в компании после меня

- Единая система управления 100+ проектами в портфеле 800+ млрд ₽
- Скорость выполнения задач выросла на 40–45%
- Операционные расходы снизились на 15–20%
- Рабочий день сократился с 12 до 9 часов
- Реорганизация проведена без единого увольнения
- Полный комплект регламентов и шаблонов PMI
- Реестр рисков, ведомость изменений, контрольные точки
- Базы задач, НСИ и панель мониторинга
- Матрица ответственности и план коммуникаций
- Обученная команда и система грейдов

ОТКРЫТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Обсудим похожий проект

Руководитель проектов · портфеля проектов · проектного офиса

Казим Давидов

Telegram: @kazim40000

WhatsApp: +7 967 699-94-84

Звонки: +7 966 667-66-72

Россия · Москва, возможен переезд и командировки
